






Usinage grain d'orge sur montant, cintres (imposte) et traverses intermédiaires élargies (V.fixes + vantaux)
60 x 30 mm

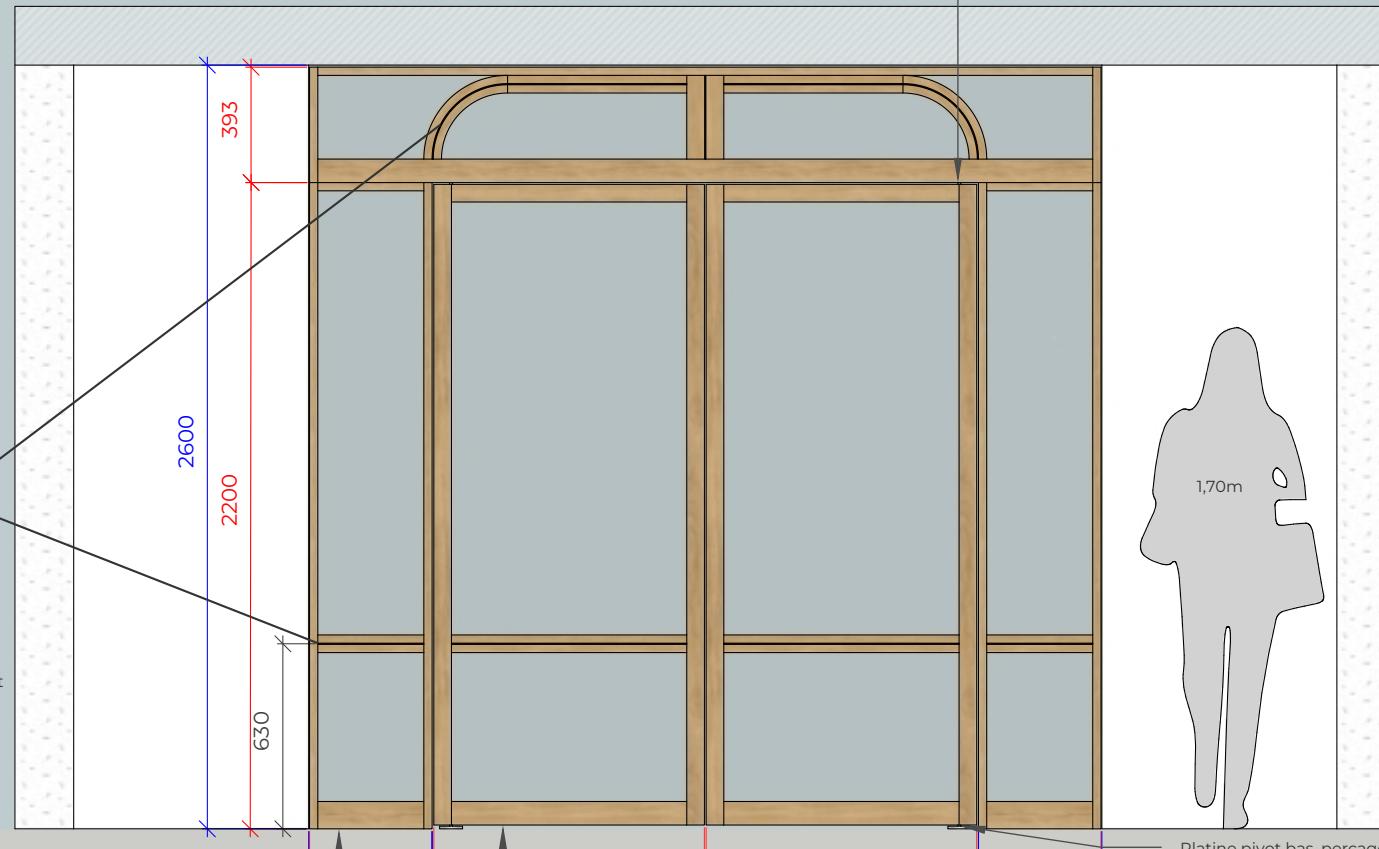

Traverse basse élargie

Platine pivot bas, perçage au sol,
attention à la présence éventuelle de chauffage
au sol ou d'éléments techniques intégrés.




IMPORTANT

Eléments lourds et volumineux, veillez à prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir réceptionner et manipuler les verrières.
Pour rappel, nos verrières sont livrées au rez de chaussée, pas de porte.

Cotes de FABRICATION
Cotes d'OUVERTURE

Fiche de relevé de cotes

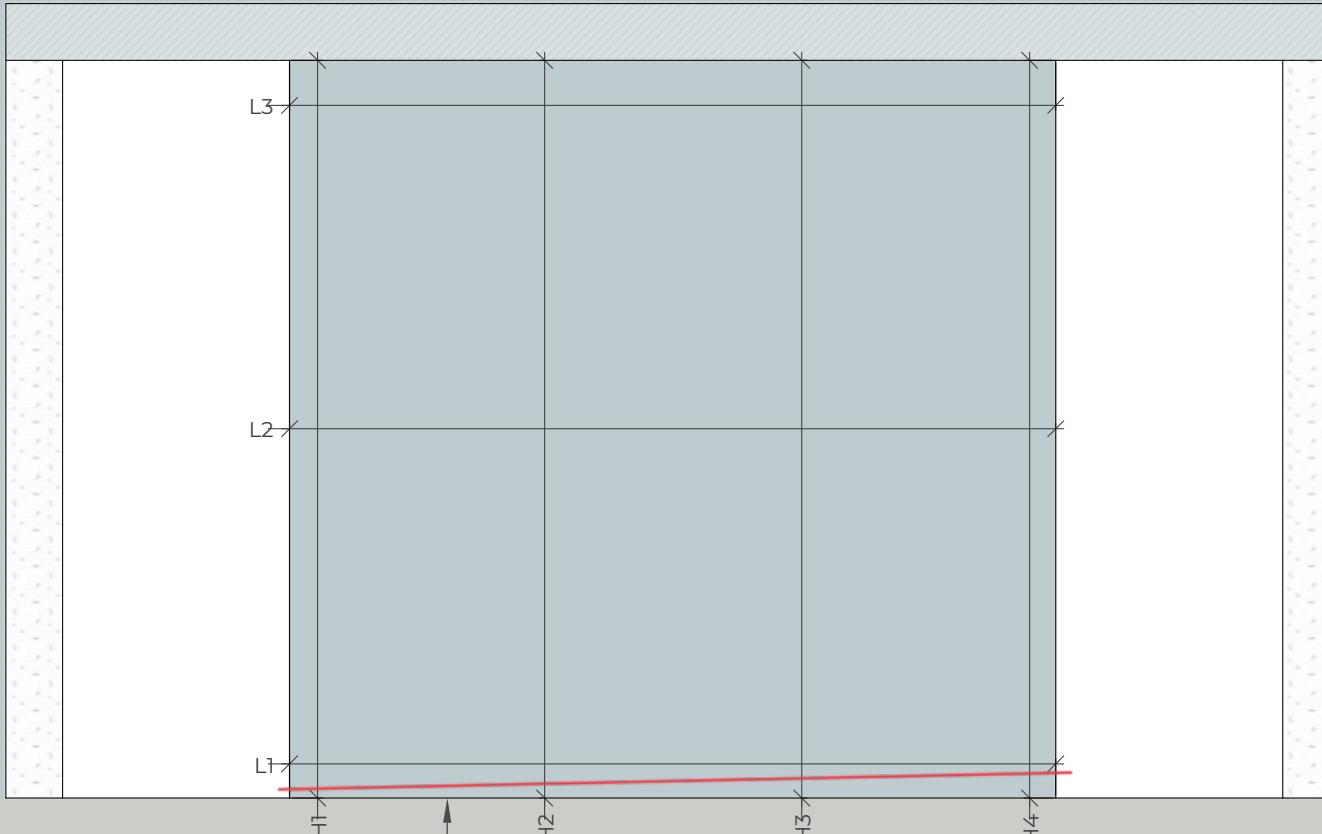

H1 = 2664

H2 = 2565

H3 = 2567

H4 = 2555

L1 = 2572

L2 = 2580

L3 = 2580

Epaisseur cloison: 105 mm

Nature cloison: Carreaux plâtre

Nature plafond: IPN

Commentaires: Faux aplomb
Du au sol de
11MM
IPN en partie
Haut

les pivots bas sont fixés par tirefonds de \pm 3 cm.
S'assurer de l'absence de gaines, chauffage au sol
ou tout élément sensible avant perçage

Cotes de FABRICATION
Cotes d'OUVERTURE
